Nr.	Zeilenbezeichnung	Gewerk	Leistungsträger	Dauer	Start	Ende
1	**Bauablaufplanung**	**Bauablaufplanung**		**70w 3t**	**20.10.2020**	**25.02.2022**
2	Baustart				20.10.2020	20.10.2020
3	Fertigstellung				04.02.2022	04.02.2022
4	**Meilensteine**	**Meilensteine**		**46w 2t**	**14.12.2020**	**15.11.2021**
5	Start Ausführung Rohbau				14.12.2020	14.12.2020
6	Start Ausführung TGA				26.04.2021	26.04.2021
7	Hülle Dicht VG				30.04.2021	30.04.2021
8	Hülle Dicht Halle				16.07.2021	16.07.2021
9	Start Ausführung Aushau				12.04.2021	12.04.2021
10	Start Ausführung Aussenanlagen				15.11.2021	15.11.2021
11	**Planungstermine**	**Planungstermine**		**2w**	**01.12.2020**	**14.12.2020**
12	Erstellung der Schal- und Bewehrungspläne				01.12.2020	01.12.2020
13	Einreichen der Pläne beim Prüfstatiker				01.12.2020	01.12.2020
14	Prüffrist Prüfstatiker (S+B-Pläne)			2w	01.12.2020	14.12.2020
15	Ausführungsplanung TGA				01.12.2020	01.12.2020
16	Ausführungsplanung Elektro				07.12.2020	07.12.2020
17	**BAUAUSFÜHRUN(**	**BAUAUSFÜHRUNG**		**69w**	**20.10.2020**	**25.02.2022**
18	**BAUGRUBE**			**9w 1t**	**20.10.2020**	**22.12.2020**
19		Erdbau	STRABAG	9w 1t	20.10.2020	22.12.2020
20		Projektbüro stellen			01.12.2020	01.12.2020
21	**Rohbau**			**35w 1t**	**14.12.2020**	**25.08.2021**
22		Kran stellen	TIETZ	1t	14.12.2020	14.12.2020
23		Baustelleneinrichtung	TIETZ	1w	14.12.2020	18.12.2020
24		Schnurgerüst stellen	TIETZ	1w	14.12.2020	18.12.2020
25	Verwaltungsgebäude	Rohbau	TIETZ	13kw 4kt	11.01.2021	16.04.2021
26	Halle	Rohbau Fundamente	TIETZ	3w 4t	16.04.2021	12.05.2021
27	Halle	Rohbau Bodenplatte	TIETZ	4w	29.07.2021	25.08.2021
28	**HÜLLE**			**14w 2t**	**15.04.2021**	**28.07.2021**
29	**Verwaltungsgebäu**			**11w 2t**	**15.04.2021**	**07.07.2021**
30		Fenster		2w	16.04.2021	29.04.2021
31		Dach		3w 4t	15.04.2021	11.05.2021
32		Putz		8w 1t	30.04.2021	30.06.2021
33		Raffstoren		3t	01.07.2021	05.07.2021
34		Klempnerarbeiten/Restleistun		1w	01.07.2021	07.07.2021
35	**Halle**			**10w 2t**	**14.05.2021**	**28.07.2021**
36		Stahlbau		10w 2t	14.05.2021	28.07.2021
37	Hülle Dicht Halle				28.07.2021	28.07.2021
38	**INNENAUSBAU VG**			**26w 1t**	**26.04.2021**	**28.10.2021**
39		Trockenbau Wände Vorsteller		2w	26.04.2021	07.05.2021
40		HLS Rohinstallation Decken		4w	26.04.2021	25.05.2021
41		Elektro Rohinstallation Decke		2w	26.04.2021	07.05.2021
42		Elektro Rohinstallation Wände		4w 3t	10.05.2021	14.06.2021
43		Trockenbau Decke UK		2w	10.05.2021	25.05.2021
44		HLS Rohinstallation Wände		3w 3t	17.05.2021	11.06.2021
45		Mobiletrennwand UK		2t	10.05.2021	11.05.2021
46		Innenputz		2w	14.06.2021	25.06.2021
47		Trockenbau Wände schließen		2w	28.06.2021	09.07.2021
48		Verlegen Fußbodenheizung		2w	12.07.2021	23.07.2021
49		Estrich		1w	26.07.2021	30.07.2021
50		Inbetriebnahme Heizung		3t	02.08.2021	04.08.2021
51		Estrich Trocknungsphase		3w	02.08.2021	20.08.2021
52		Fliesen Wand		3w	09.08.2021	27.08.2021
53		Trockenbau Decke schließen		2w	09.08.2021	20.08.2021
54		Einbau Alu-Glas Rahmentüre		1w	23.08.2021	27.08.2021
55		Innenputz Restarbeiten		3t	23.08.2021	25.08.2021
56		Fliesen Boden		1w	30.08.2021	03.09.2021
57		Bodenbelag PVC		2w	23.08.2021	03.09.2021
58		Maler		2w	06.09.2021	17.09.2021
59		Elektro Fertiginstallation		2w	13.09.2021	24.09.2021

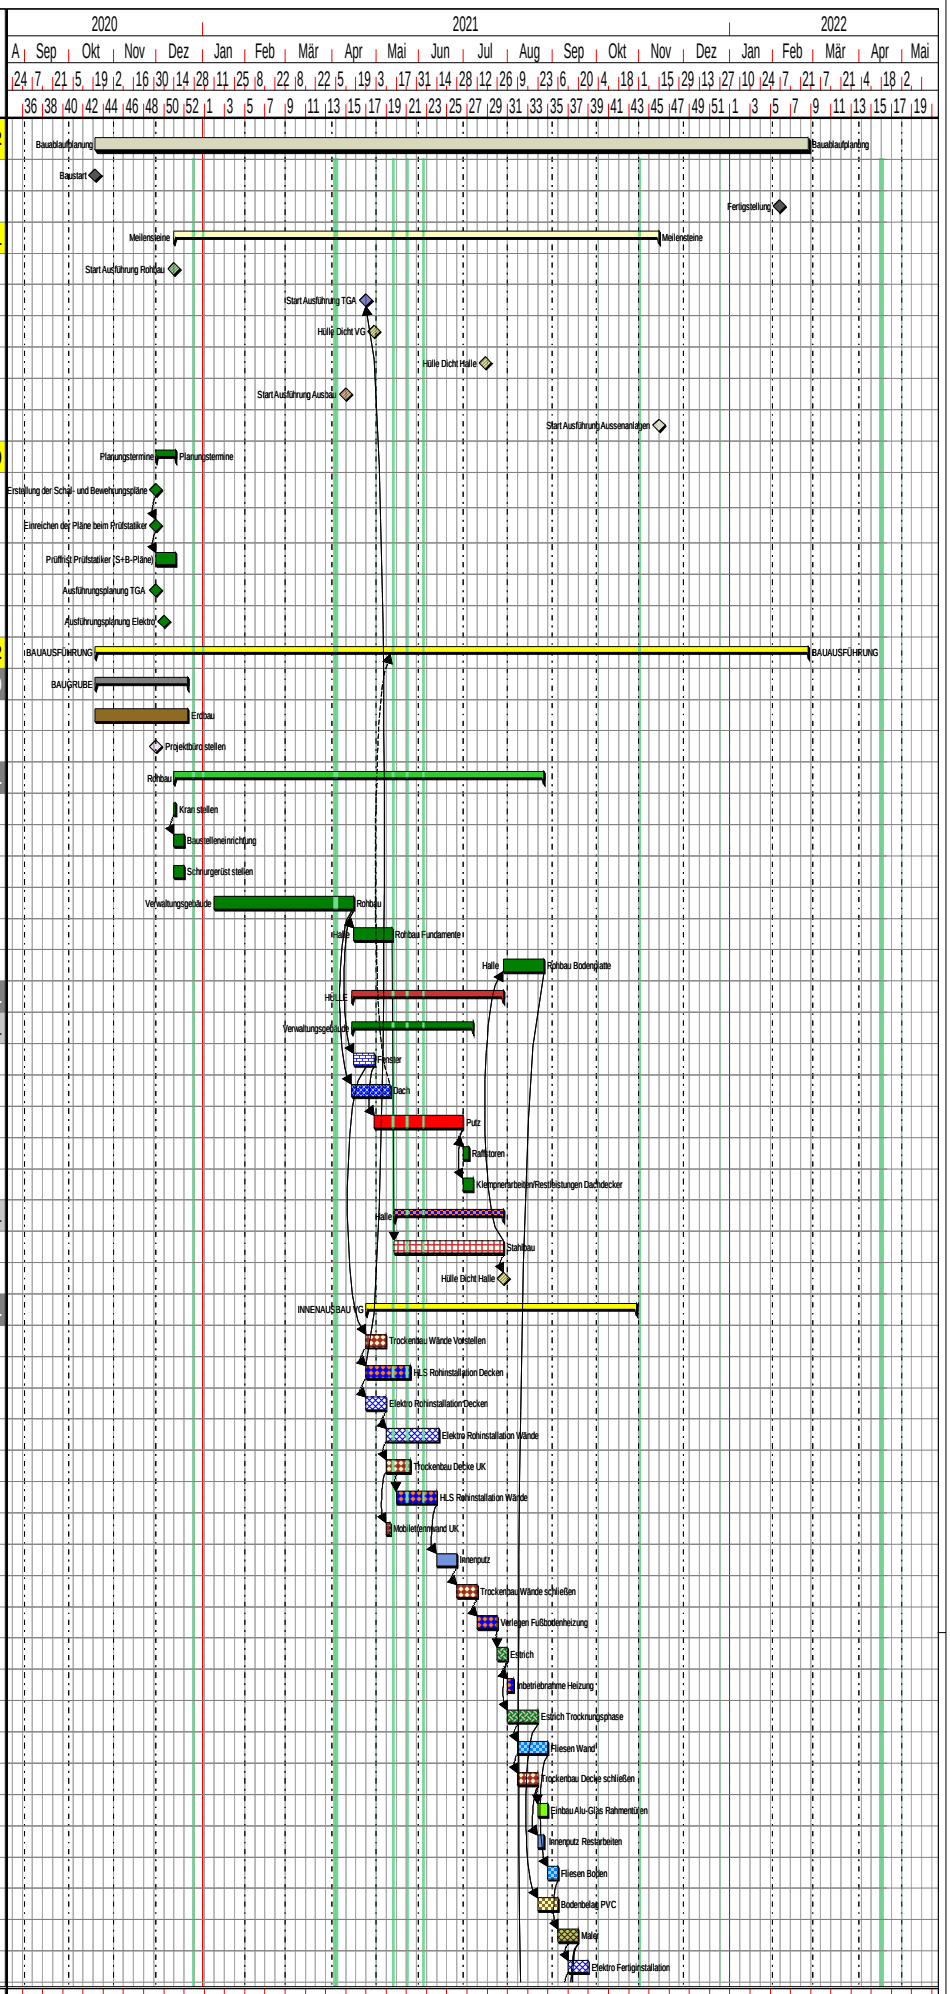

Bauherr:	Ausführung: Ed. Züblin AG, Bereich Bon, Siegburger Straße 241, D-50679 Köln	Projekt: Betriebshof Nackhausen
Projektsteuerung:	Fachplanung:	Planinhalt:
		Plannummer:
		Planersteller: Datum:

Nr.	Zeilenbezeichnung	Gewerk	Leistungsin	Dauer	Start	Ende
60		HLS Fertiginstallation		2w	13.09.2021	24.09.2021
61		Spinde liefern/aufstellen		2t	20.09.2021	21.09.2021
62		Türblätter		4t	20.09.2021	23.09.2021
63		Montage Mobile Trennwand		1w	24.09.2021	30.09.2021
64		Inbetriebnahme Elektro		1w	27.09.2021	01.10.2021
65		Inbetriebnahme Sanitär (Spül		1w	27.09.2021	01.10.2021
66		Maler Beschichtung Zargen /		1w	01.10.2021	07.10.2021
67		Montage Schließanlage		2t	01.10.2021	04.10.2021
68		Montage Briefkastenanlage		2t	01.10.2021	04.10.2021
69		Bauendreinigung		1w	08.10.2021	14.10.2021
70		Vorbegehung		1w	15.10.2021	21.10.2021
71		Mängelbeseitigung/Restarbeit		1w	22.10.2021	28.10.2021
72		Einregelung / Übergabe		9w	29.10.2021	31.12.2021
73	INNENAUSBAU			17w 3t	26.08.2021	28.12.2021
74		Trockenbau Wände Vorsteller		2w	26.08.2021	08.09.2021
75		HLS+Druckluft Rohinstallatior		4w	26.08.2021	22.09.2021
76		Elektro Rohinstallation Decke		4w	26.08.2021	22.09.2021
77		Trockenbau Decke UK		2w	16.09.2021	29.09.2021
78		Elektro Rohinstallation Wände		2w	16.09.2021	29.09.2021
79		HLS Rohinstallation Wände		1w	23.09.2021	29.09.2021
80		Trockenbau Wände schließer		2w	29.09.2021	12.10.2021
81		Inbetriebnahme Heizung		3t	13.10.2021	15.10.2021
82		Fliesen Wand		3w	13.10.2021	03.11.2021
83		Trockenbau Decke schließen		2w	13.10.2021	26.10.2021
84		Maler		2w	04.11.2021	17.11.2021
85		Elektro Fertiginstallation		2w	11.11.2021	24.11.2021
86		HLS Fertiginstallation		2w	11.11.2021	24.11.2021
87		Türblätter		4t	18.11.2021	23.11.2021
88		Inbetriebnahme Elektro		1w	24.11.2021	30.11.2021
89		Maler Beschichtung Zargen /		1w	01.12.2021	07.12.2021
90		Montage Schließanlage		2t	01.12.2021	02.12.2021
91		Inbetriebnahme Sanitär (Spül		1w	08.12.2021	14.12.2021
92		Bauendreinigung		1w	08.12.2021	14.12.2021
93		Vorbegehung		1w	15.12.2021	21.12.2021
94		Mängelbeseitigung/Restleistu		1w	22.12.2021	28.12.2021
95		Einregelung / Übergabe		8w 2t	29.12.2021	24.02.2022
96		Gesamtabnahme			25.02.2022	25.02.2022
97	AUßENANLAGEN			45w 4t	04.01.2021	26.11.2021
98		Außenanlagenarbeiten	STRABAG	45w 4t	04.01.2021	26.11.2021

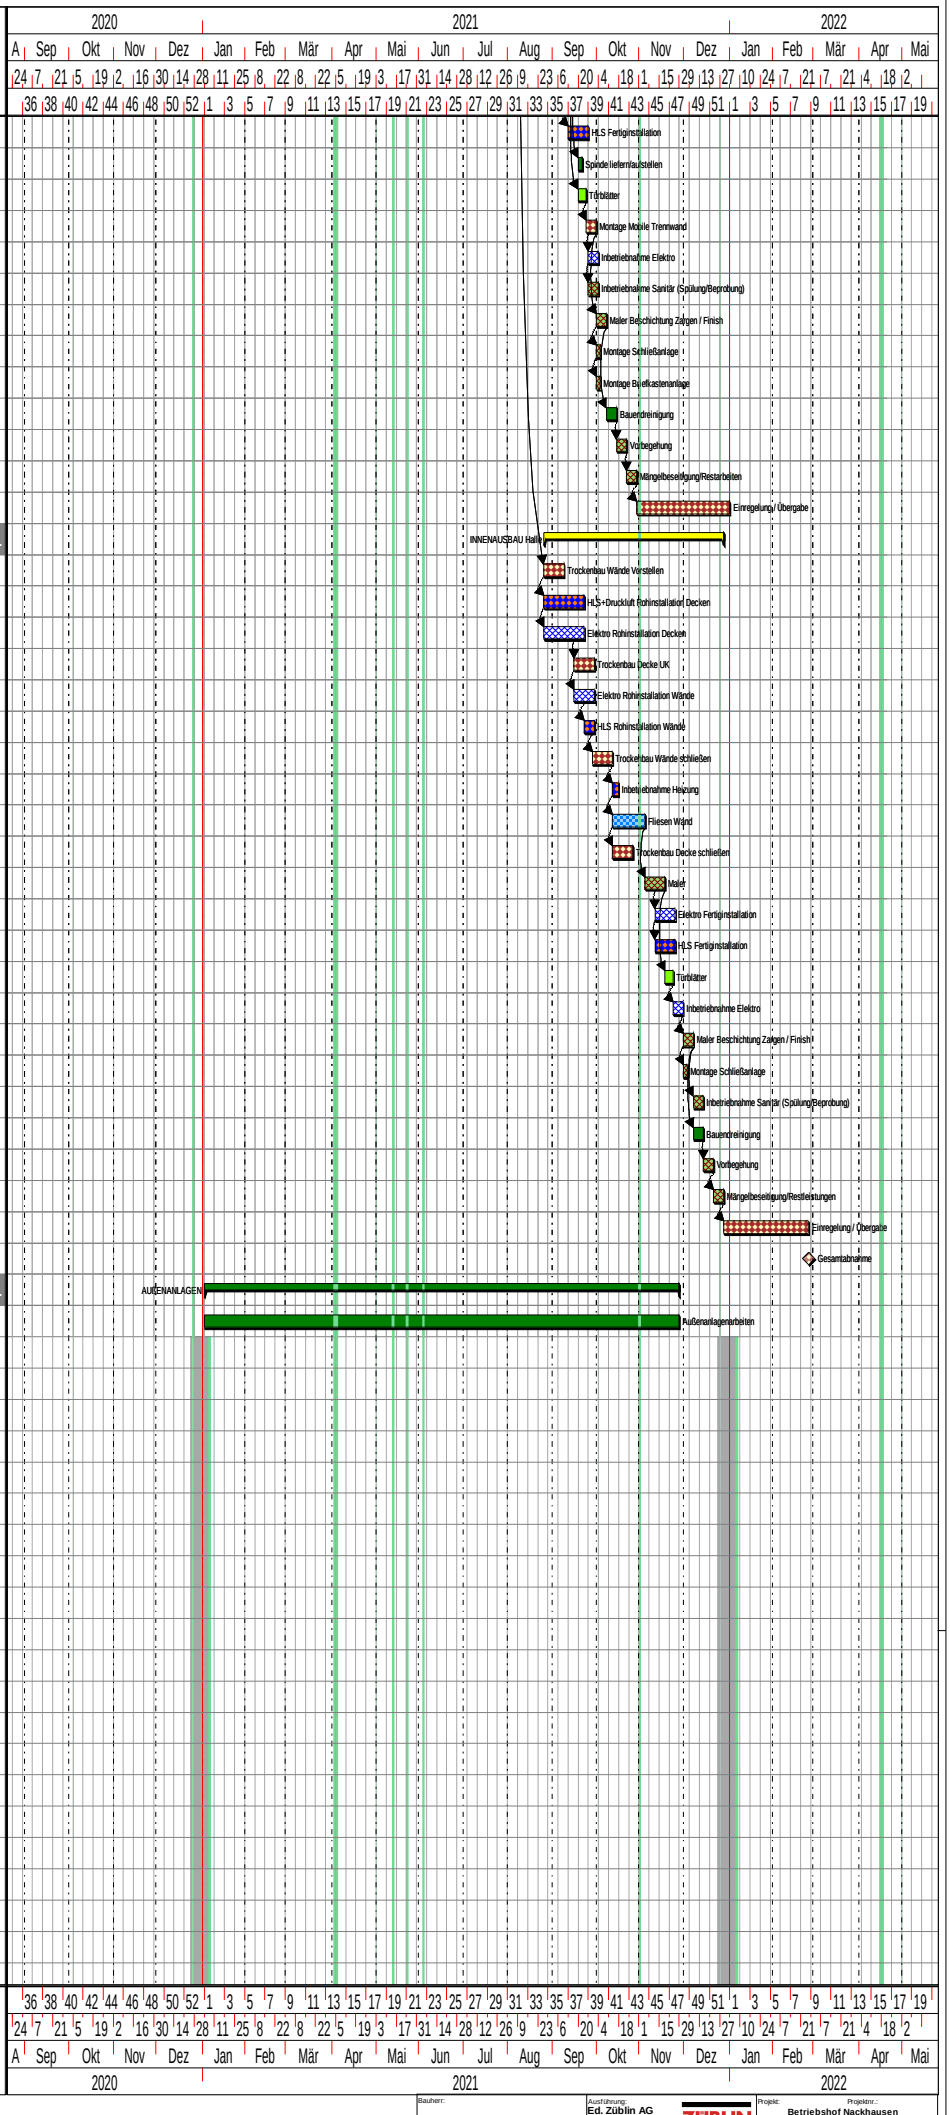

Nr.	Zeilenbezeichnung	Gewerk	Leistungsin	Dauer	Start	Ende

Bauherr:	Ausführung: Ed. Züblin AG, Bereich Bon, Siegburger Straße 241, D-50679 Köln	ZÜBLIN	Projekt: Betriebshof Nackhausen; Projektnr.:
Projektsteuerung:	Fachplanung:		Planinhalt:
			Plannummer:
			Planersteller: Datum:
